
令和8年度
印南町通学路合同点検結果

令和8年9月3日（木）

印南町教育委員会

通学路合同点検箇所位置図

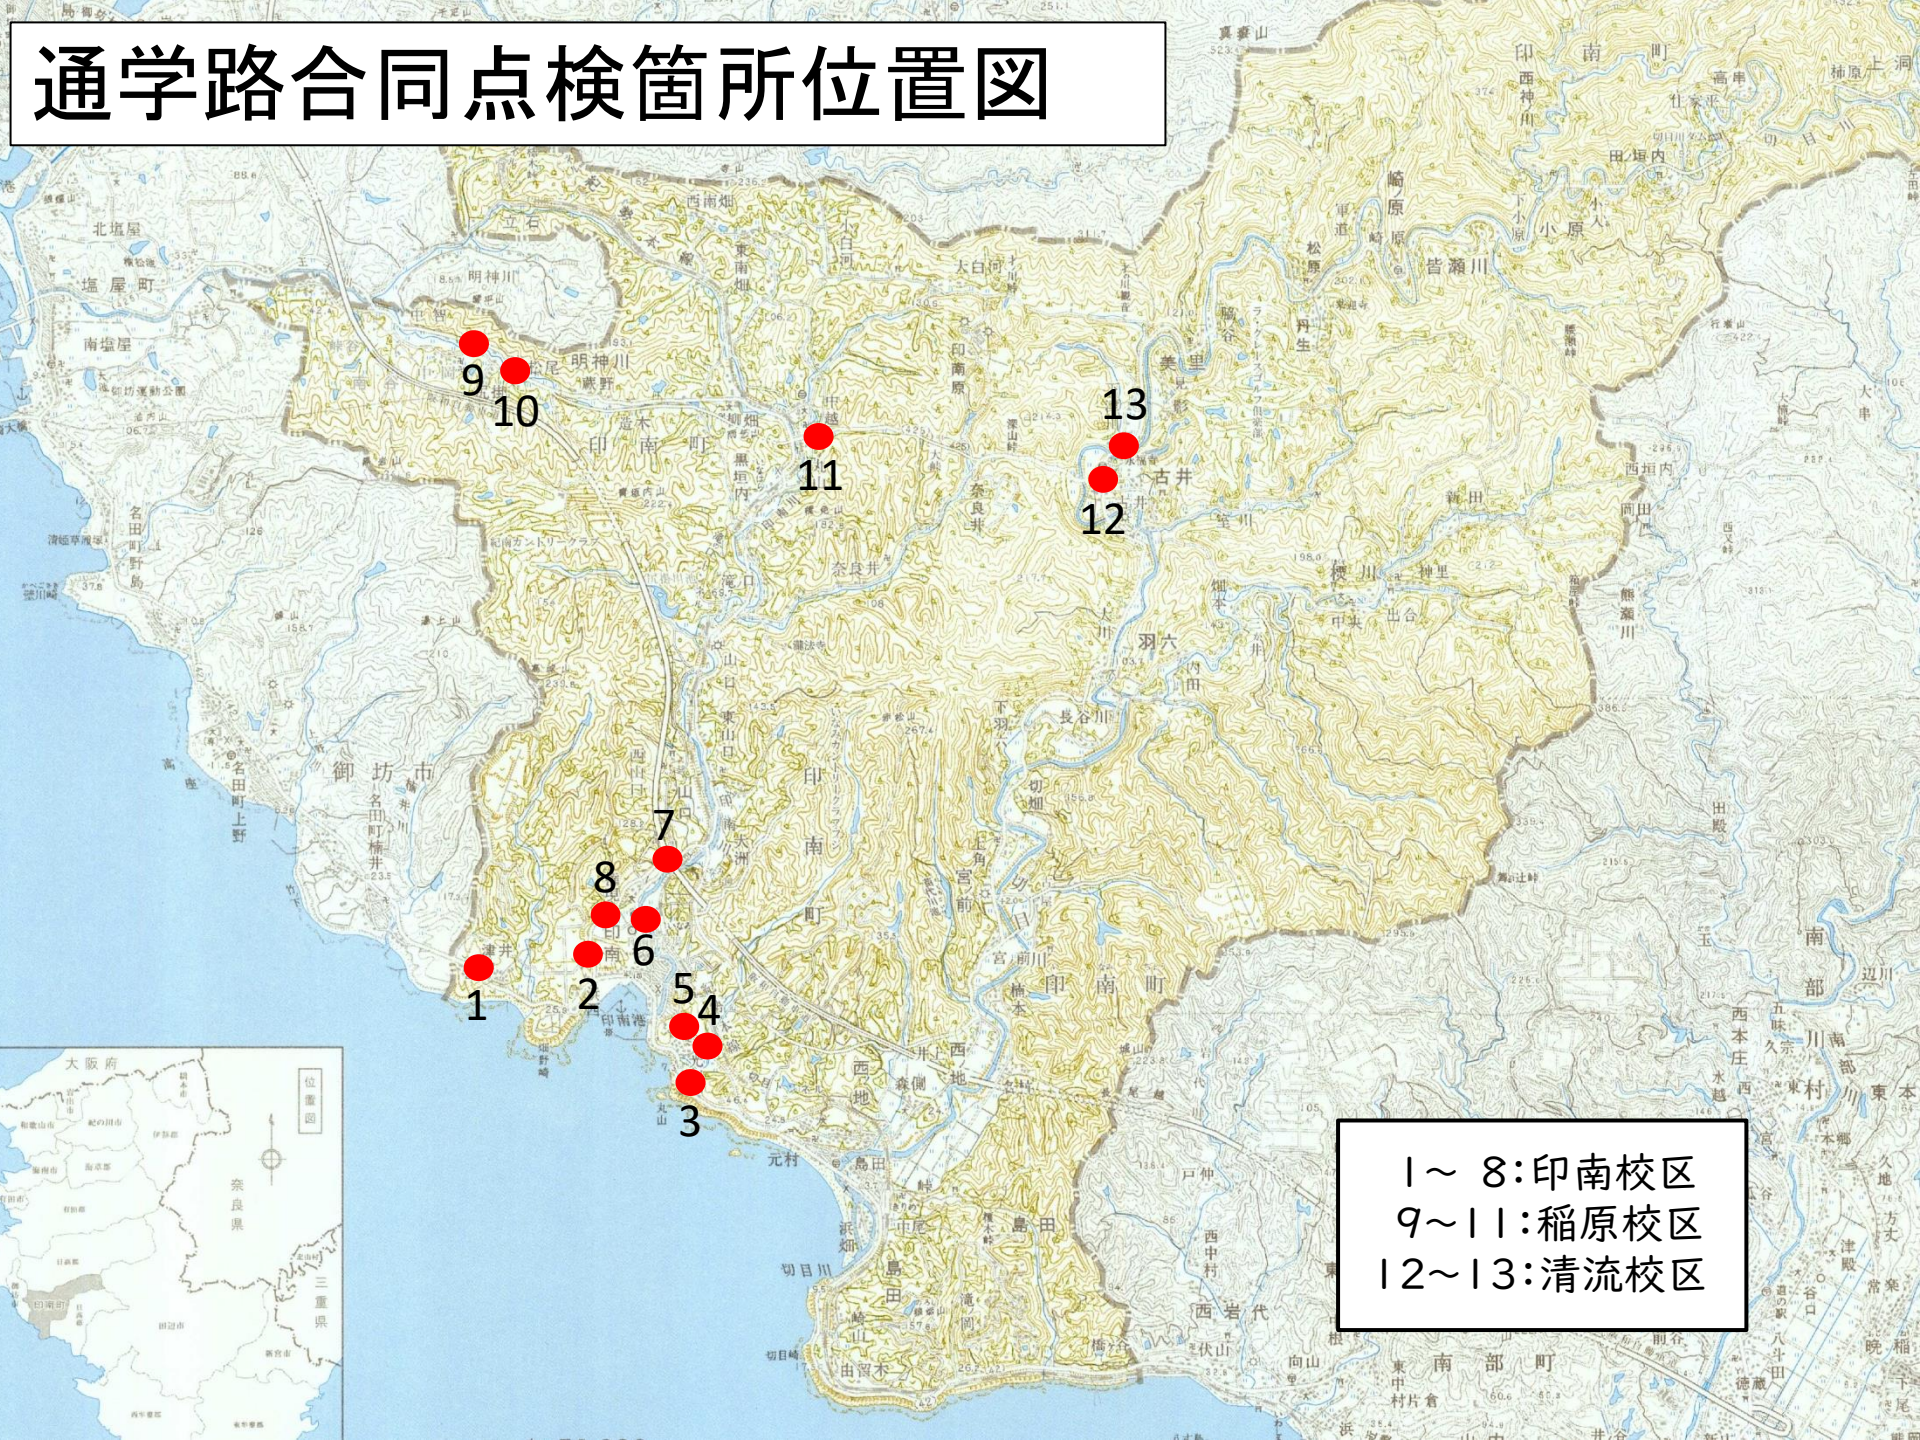

和歌山県日高郡印南町　印南小中学校校区（通学路合同点検　1･2）

【合同点検メンバー】 御坊警察署　紀南河川国道事務所　日高振興局建設部　印南町役場　印南町教育委員会　　･･点検箇所の説明　　･･協議結果

点検箇所①（国道42号）
・路肩のグリーンベルトが薄くなっており、塗り直しをお願いしたい。

対策メニュー
・グリーンベルトの塗り直し



1

（紀南河川国道事務所）
道路舗装工事が行われるので、その工事内でグリーンベルトの塗り直しを実施。

点検箇所②（県道28号線　印南原印南線）
・横断報道を設置しているが、交通量も多く、さらなる対策をお願いしたい。

対策メニュー
・路面標示等



2

（日高振興局）※道路課
「速度おとせ」「学童注意」等の路面標示を設置。

和歌山県日高郡印南町　印南小中学校校区（通学路合同点検 3）

【合同点検メンバー】 御坊警察署 紀南河川国道事務所 日高振興局建設部 印南町役場 印南町教育委員会

・・点検箇所の説明　・・協議結果

（紀南河川国道事務所）
グリーンベルトの設置や「学童注意」等の路面標示を設置。
通学路としての歩道設置についても検討。

点検箇所③（国道42号）
・一部区間に歩道がなく、通学の際に危険である。

対策メニュー
・歩道の設置



和歌山県日高郡印南町　印南小中学校校区（通学路合同点検 4･5）

【合同点検メンバー】 御坊警察署 紀南河川国道事務所 日高振興局建設部 印南町役場 印南町教育委員会　　・・点検箇所の説明　　・・協議結果



和歌山県日高郡印南町　印南小中学校校区（通学路合同点検 6）

【合同点検メンバー】 御坊警察署 紀南河川国道事務所 日高振興局建設部 印南町役場 印南町教育委員会

・・点検箇所の説明　・・協議結果

点検箇所⑥（統合中学校通学路）
・交通量の多い道であるが、歩道がなく、
道幅が狭いところがあり危険である。

対策メニュー
・グリーンベルト、ガードパイプ等の設置。

（建設課）
町道に関して、グリーンベルトやガードパイプ等の安全対策を検討。
（日高振興局）
県道に関して、グリーンベルト等の安全対策を検討。※道路課、管理保全課



和歌山県日高郡印南町　印南小中学校校区（通学路合同点検 7･8）

【合同点検メンバー】 御坊警察署 紀南河川国道事務所 日高振興局建設部 印南町役場 印南町教育委員会　　・・点検箇所の説明　　・・協議結果

（日高振興局）
「速度おとせ」「学童注意」等の路面標示の設置。
※道路課
カーブ部分の伐採。※管理保全課

点検箇所⑧（県道28号）
・第Ⅰテック前に横断歩道があるが、スピードを出す車が多い。
対策メニュー
・路面標示等。





点検箇所⑦（県道28号）
・交通量も多く、スピードを出す車も多い。
対策メニュー
・路面標示、横断歩道の塗り直し。

（日高振興局）
「速度おとせ」「学童注意」等の路面標示の設置。※道路課、管理保全課

和歌山県日高郡印南町　稲原小中学校校区（通学路合同点検 9･10）

【合同点検メンバー】 御坊警察署 紀南河川国道事務所 日高振興局建設部 印南町役場 印南町教育委員会　　・・点検箇所の説明　　・・協議結果

（御坊警察署）
横断歩道の塗り直し。
（日高振興局）
消えた路面標示「スピードおとせ」の設置。※管理保全課

点検箇所⑨（国道425号線）
・国道を通る車がスピードを出しやすい場所であり、横断歩道と停止線が消えかかっている。
対策メニュー
・横断歩道の塗り直し。

（御坊警察署）
見通しが悪く、横断歩道の設置は困難。

点検箇所⑩（国道425号線）
・国道を通る車がスピードを出しやすい場所であり、細道との交差点が分かりづらい。
対策メニュー
・横断歩道等の設置。





和歌山県日高郡印南町　稲原小中学校校区（通学路合同点検　11）

【合同点検メンバー】 御坊警察署　紀南河川国道事務所　日高振興局建設部　印南町役場　印南町教育委員会　　・・点検箇所の説明　　・・協議結果

点検箇所⑪（国道425号線）
・東西方向の道路が下り坂と急なカーブのため、児童が
　横断していることに気づきにくい。横断歩道が見えにくい。
対策メニュー
・信号の設置、横断歩道の塗り直し。

（御坊警察署）
　横断歩道の塗り直し。
（日高振興局）
　標識にかかっている木の伐採。※管理保全課



11

100 m

和歌山県日高郡印南町　清流小中学校校区（通学路合同点検　12･13）

【合同点検メンバー】 御坊警察署　紀南河川国道事務所　日高振興局建設部　印南町役場　印南町教育委員会

　　・・点検箇所の説明　　・・協議結果

点検箇所⑬（古井地内）
・交通量も多く、片側には歩道がなく、児童が安全に歩くために道を横断する必要がある。
対策メニュー
・下津川集会所付近に横断歩道を設置が望ましい。

（御坊警察署）
横断指導線を検討。



点検箇所⑫（古井地内）
（1）交差点より中学校方面に向けて100mほど歩道がなく、路側帯も狭い。
　　看板等に接触して転倒する生徒もいた。
（2）防災センター方面からの車両と、美里方面からの自転車通学生が、
　　出会い頭の事故を起こす恐れがある。（交通指導員からの指摘があり）
対策メニュー
（1）歩道の設置。
（2）防災センター方面からの車道に、一時停止線。またはカーブミラーの設置。

12－（1）：（日高振興局）
　グリーンベルトの設置。※道路課
12－（2）：（日高振興局）
　消えた停止誘導線の設置。※管理保全課



